

原価管理システム
どっと原価 NEO

原価管理システム
どっと原価 NEOクラウド



一ゆとりある企業づくりをサポートする一

株式会社 **建設ドットウェブ**


会社情報

会 社 名	株式会社 建設ドットウェブ
営 業 所 住 所	大阪府大阪市淀川区西中島三丁目23番15号 セントアーバンビル5階
本 社 所 在 地	石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢ジーサイドビル 3階
拠 点	東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島
設 立	2001年1月26日(平成13年)
従 業 員 数 役 員 数	従業員数:72名
事 業 内 容	個別原価管理システム開発・販売 運用コンサルティング

建設業を取り巻く環境

建設投資額の推移(関西)

■ 建 築 ■ 土 木

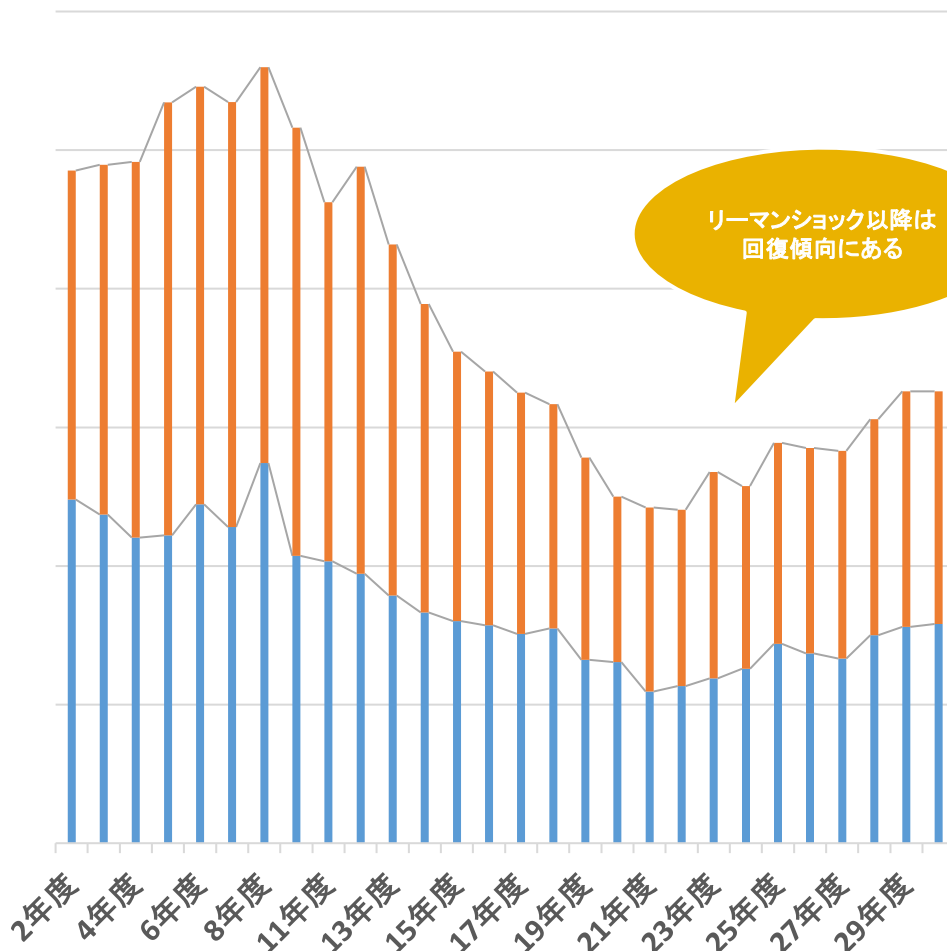

■ プラス要素

国土強靱化基本法成立

10年間で200兆円の社会資本整備、災害対策整備が行われる

南海トラフ対策・平成30年度7月豪雨復興支援

2020年 東京オリンピック・パラリンピック開催決定

中央リニア新幹線開業決定

2027年 東京～名古屋間

2045年 東京～大阪間

経済効果 8.35兆円

2025年 大阪万博開催決定

経済効果 2兆円

■ マイナス要素

社会保険未加入業者の排除

(雇用保険加入61%、厚生年金保険61.9%)

国土省 標準見積書への法定福利費及び労務管理の記載の義務化

建設資材の高騰

就業者の高齢化

人出不足

外国人労働者の受入

環境対策

(注)国土交通省 平成29年度建設投資見通し


受注増加と人手不足

一方、建設業界では人材不足、人件費・資材費の高騰などによるコスト増への課題がますます深刻化。



【建設技能労働者過不足の推移】

建設業におけるコストマネジメントの重要性

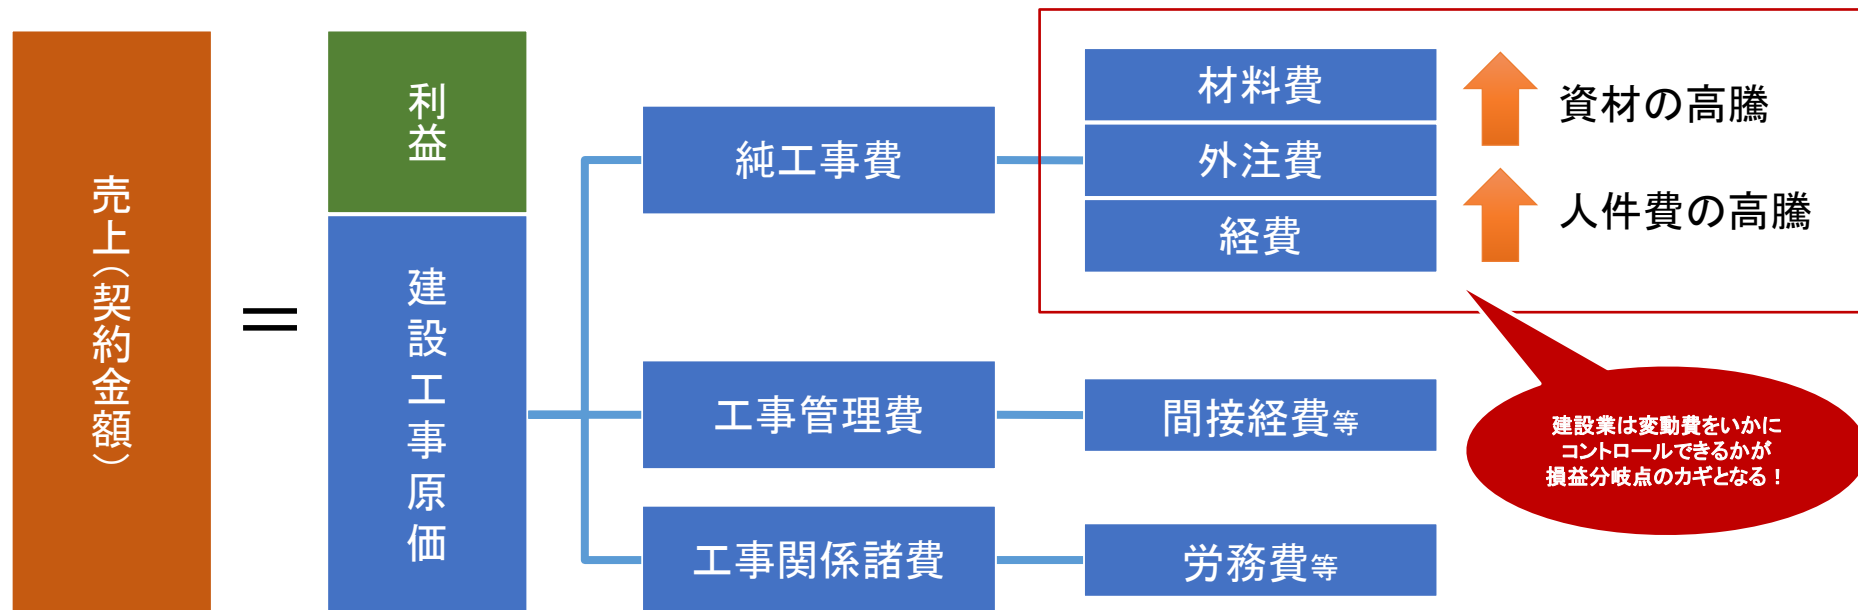


建設業が活況を呈し、今後も大手・中堅企業から工事件数(受注高)は増加傾向が見込まれます。
しかし、あらゆる要因により、工事原価が膨れ、利益が減っている状況です。

工事管理・事務作業量を削減しつつ、
個別工事利益を確保する仕組みの構築が必要！

建設業の業務を分解


原価管理は会社の幹となる業務です

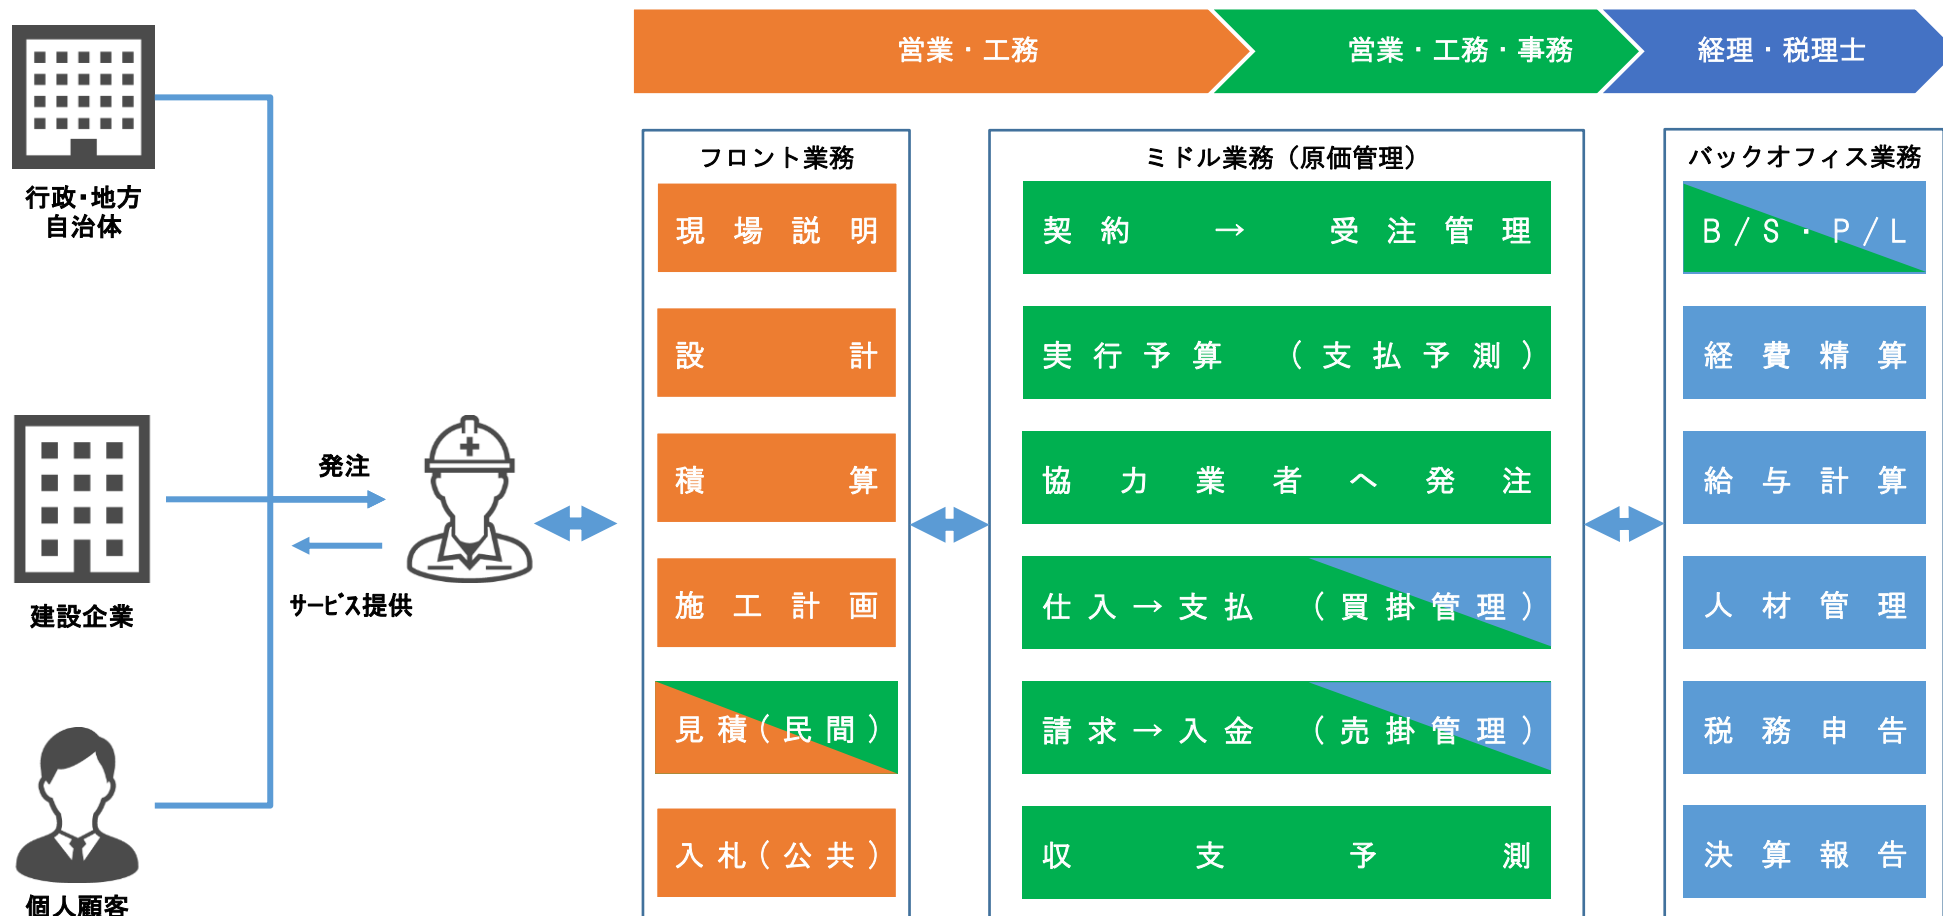

フロント・バックオフィスはシステム化が進んでいるが
ミドル業務(原価管理)はシステム化できていない企業が多い！


原価管理 Excelからの脱却

原価管理の方法

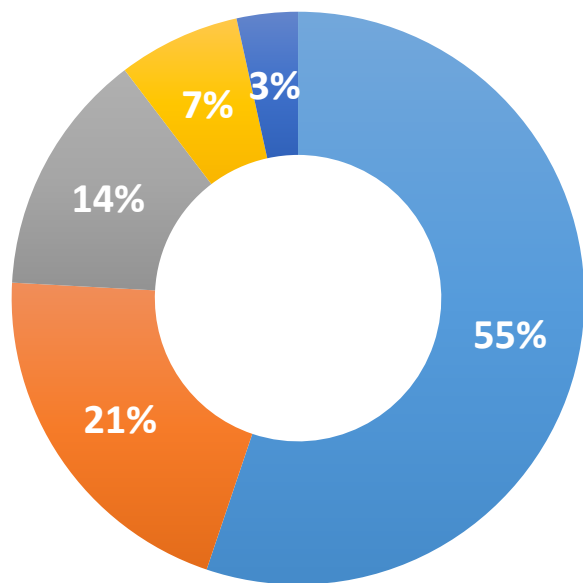

- Excel
- 手書き
- システム(パッケージ)
- システム(Access)
- システム(スクラッチ)

原価管理をシステム化していない企業は約7割強
Excel管理がほとんどで、転記業務が多く発生してしています。

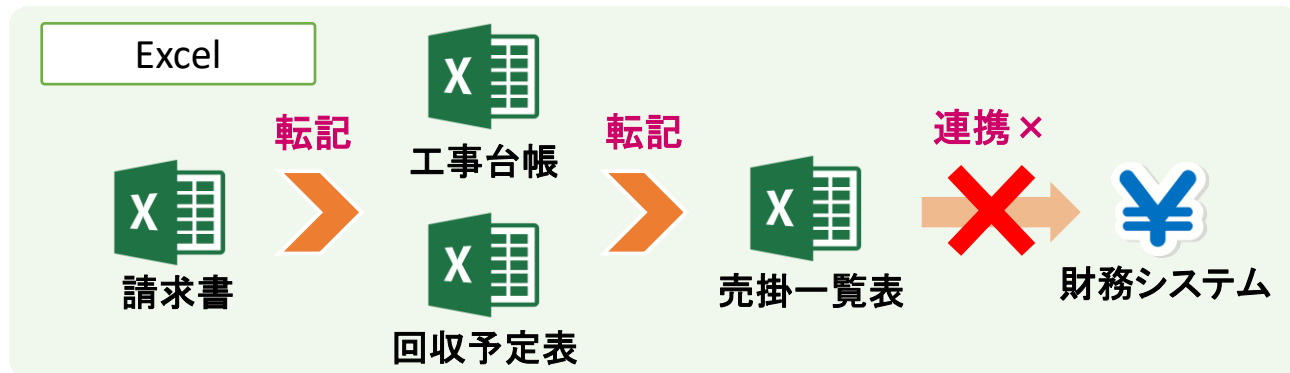

中小建設業の原価管理ポイント


- ①仕事を繋げる 一連の流れで管理する
- ②二度手間を減らす 事務の作業効率を上げる
- ③見える化する リアルタイムに収益を把握する

原価管理 システム化のメリット



業務の効率化

手動で行っていた業務プロセスが自動に変わります。例えば、仕入管理や請求書の管理などは、会社の規模が大きくなるほど手動ですべて処理するのは手間とコストがかかります。どっと原価NEOで管理することで、自動的に業務化され作業の効率化が可能です。



業務の属人化を防ぐ

共通のシステムを利用することによって、特定の社員がいないと業務が遂行できないといった業務の属人化を防ぎます。社員でもアルバイトでも、誰が担当しても同じように業務が扱えるので、クオリティの標準化も可能です。



ヒューマンエラーの削減

業務の自動化によって、ヒューマンエラーやミスの削減ができます。手動オペレーションの場合、繰り返し確認を行っていても、少なからずヒューマンエラーが発生します。どっと原価NEOの導入によって、入力漏れや転記ミス、担当者同士のコミュニケーションエラーといったヒューマンエラーを防止し、大きなミスにつながるのを未然に防ぎます。



情報の一元化

業務に必要な情報を一元化することで、必要なときに必要な情報をすぐに抽出できるようになります。一カ所でデータ管理することでファイルの紛失や破損、最新版の重複という事態が生じる心配もありません。また、一元化することで異なった情報同士を連動させることができます。例えば、「受注と会計処理」と、一連の業務は連動しているほうが効率的で望ましいといえます。何らかのミスや不具合が発生したときに、どのプロセスに問題があったのか把握することも容易になるでしょう。



- **担当者別**で工事一覧収支を把握したい。
- **拠点別**で工事一覧収支を把握したい。
- **受注区分別（新築・リフォーム・増改築）**で工事一覧収支を把握したい。
- **未成工事・完成工事一覧表**作成を効率化したい。

工事原価一覧表

<2013年5月末>

工事名 工期	区分	担当者	請負額	実行予算	目標粗利 目標粗利率	当月原価 累計原価	原価内訳(上段:当月 下段:累計)				予算差 消化率	進捗率	粗利	備考
							材料費	労務費	外注費	経費				
建設ドットウェブ 1F 床工事	未	田中一郎	7,560,000	6,649,600	910,400	174,000	0	144,000	0	30,000	893,100		1,803,500	
2013/4/15~2013/6/15					12%	5,756,500	5,442,500	144,000	110,000	60,000	87%	70%	24%	
ABC工事	完	鈴木太郎	15,350,000	14,000,000	1,350,000	3,500,000	1,000,000	2,000,000	350,000	150,000	500,000		1,850,000	
2013/4/1~2013/5/15					9%	13,500,000	2,000,000	5,000,000	6,000,000	500,000	96%	100%	12%	
DEF工事	完	佐藤花子	8,000,000	7,000,000	1,000,000	500,000	50,000	300,000	0	150,000	0		1,000,000	
2013/4/15~2013/6/20					13%	7,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	100%	100%	13%	
合計			30,910,000	27,649,600	3,260,400	4,174,000	1,050,000	2,444,000	350,000					
					11%	26,256,500	9,442,500	7,144,000	7,110,000					



工事経歴書

(建設工事の種類) 土木一式工事 (税込 ・ ○ 税抜)

注 文 者	元請 又は 下請 の別	JV の 別	工 事 名	工事現場のある 都道府県及び 市区町村名	配 置 技 術 者		請 負 代 金 の 額		工 期		
					氏 名	主任技術者又は 監理技術者の別 (印章欄所シ印を記載) 主任技術 者 監理技術者		うち、 〔 ○ PC 海陸処理 機械上第 〕	着 工 年 月	完成又は 完成予定年月	
株式会社横浜土木	元請		平成××年度地域総合整備事業 原土幹線15号線道路改良 工事	神奈川県	林 健二 杉山 雅博	レ	レ	39,000 千円	0 千円	平成26年10月	平成27年03月
東川建設 株式会社	下請		二級河川 豊明川 広域基幹河川改修工事 豊明護岸工事第2工区	石川県	柴田 久雄	レ		24,000 千円	0 千円	平成26年10月	平成27年06月

工事経歴書の自動作成が可能です。

小 計	2 件	63,000 千円	0 千円	うち 元請工事	
				39,000 千円	0 千円
合 計	2 件	63,000 千円	0 千円	うち 元請工事	
				39,000 千円	0 千円

業務改善例

受注管理

様式第7号(第34条関係)(甲)

労働保険 一括有期事業報告書(建設の事業)

この3部は確定保険料申告の際に、記載し、正

正

労働保険番号			府県	所管	管轄	基幹番号			枝番号			6 枚
事業の名称		事業場の所在地		事業の期間		請 負 金 額 の 内 訳						労務費率
						請負代金の額	請負代金に 加算する額	請負代金から 控除する額	請負金額			
中央駅南新築工事		石川県金沢市駅西4丁目103-5		から		円	円	円	円		18%	
				から		51,000,000			51,000,000			
栗田邸新築工事		金沢市徳丸町5-8-41		から		円	円	円	円		18%	
				から		25,000,000			25,000,000			
事業の種類	33 舗装工事業			計		76,000,000			76,000,000			
	～											

前年度中(保健関係が消滅した日まで)に廃止又は終了があったそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。

郵便番号()
電話番号()

令和1年8月4日

事業主 住所 石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢ジー
どっと建設株式会社
氏名 代表取締役 土郷 一郎
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
作成年月日

労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿

別紙様式

労働保険 平成25年度一括有期事業総括表(建設の事業)

この3部は確定保険料申告の際に、記載し、正

正

労働保険番号	事業の種別	事業開始時期	請負金額	労務発生	賃金総額	労務発生	保険料額	保険料額
31	木造新築工事	19	8,000,000	19	1,440	19	128,160	
32	道路新設工事	21	15,000,000	21	3,000	21	48,000	
33	舗装工事業	20	64,500,000	20	11,610	20	116,100	
34	新築又は改築工事	21	25,694,000	21	5,605	21	72,865	
35	その他建設工事	21		21		21		
36	その他建設工事	21		21		21		
37	その他の建設工事	21		21		21		
合計			114,194,000		21,655		365,125	
					21,655		433	

一括有期事業報告書・一括有期事業総括表を
同じ様式にて集計、出力できます。

■工種（予算コード）マスター例

CD	区分	工種CD	工種名
10	仮設費	1	共通仮設工事
10	仮設費	2	仮設工事
30	建築工事費	3	杭地業工事
30	建築工事費	4	基礎工事
30	建築工事費	5	土工事
30	建築工事費	6	コンクリート工事
30	建築工事費	7	型枠工事
30	建築工事費	8	鉄筋工事
30	建築工事費	9	鉄骨工事
30	建築工事費	10	A L C工事
30	建築工事費	11	組積工事
30	建築工事費	12	防水工事
30	建築工事費	13	石工事
30	建築工事費	14	タイル工事
30	建築工事費	15	木工事
30	建築工事費	16	屋根工事
30	建築工事費	17	外壁工事
30	建築工事費	18	屋根外壁工事
30	建築工事費	19	板金工事
30	建築工事費	20	スレート工事
30	建築工事費	21	金属工事

実行予算の項目として使用します。

工種ごとに支払予算オーバーチェック管理として使用します。

■ 予算支払台帳

どっと原価 NEO EX どっと建設株式会社 - [工事原価推移表]

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(O) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) マンテナス(M) 拡張機能(S) レポート(B) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(U)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カンセル 列幅

列固定

区分別 工程別 要素別 業者別

期間 15/01 ~ 15/06 税選択 税抜

工程選択 工種 業者選択 なし 品名選択 なし

日付選択 仕入日

工事 K2002003 - 00 栗田邸新築工事

発注者	部門	営業担当者	現場代理人	受注日	契約工期(開始)	契約工期(終了)	完成日
栗田 吾郎	建築部	林 健二	加藤 健一	14/09/22	14/10/05	15/03/31	15/03/31

No	費目/工種	予算金額	発注金額	取扱外原価	原価金額	発注残高	予算残高	14 / 12迄	15 / 1	15 / 2	15 / 3	15 / 4
1		19,495,050	12,740,000	3,785,061	13,645,061	2,880,000	5,849,989	7,175,061	1,980,000	3,250,000	1,240,000	
2	直接工事費	19,495,050	12,740,000	3,750,050	13,610,050	2,880,000	5,885,000	7,140,050	1,980,000	3,250,000	1,240,000	
3	仮設工事	530,000	530,000	0	530,000	0	0	530,000	0	0	0	0
4	土工事	900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0
5	防水防湿工事	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0
6	木工事	7,960,050	2,900,000	2,600,050	5,500,050	0	2,460,000	4,900,050	600,000	0	0	0
7	屋根工事	830,000	830,000	0	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0
8	金属工事	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0
9	左官工事	240,000	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0
0	タイル工事	140,000	140,000	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0
1	鋼製建具工事	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2	木製建具工事	880,000	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0	0	0	0
3	内装工事	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000	0	0
4	雑工事	1,950,000	1,550,000	700,000	700,000	1,550,000	1,250,000	0	700,000	0	0	0
5	設備工事	2,460,000	1,180,000	450,000	450,000	1,180,000	2,010,000	0	450,000	0	0	0
6	(省略)	0	0	35,011	35,011	0	-35,011	35,011	0	0	0	0
7		0	0	35,011	35,011	0	-35,011	35,011	0	0	0	0

どっと建設株式会社(KdwGnkDat06)

会計期間 2014/01/01～2014/12/31 西暦 2018/11/07 (水) admin 3,10,0001

予算オーバーしないように、承認の仕組みを構築。**業者査定**として活用。

品名	規格	実行予算				発注				発注業者	発注日	発注番号
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額			
準備費												
仮設トイレ												
仮設トイレリース料		2	ヶ月	30,000	60,000	2	ヶ月	20,000	40,000	石川リース工業	4月1日	91001
仮設電力費		2	ヶ月	5,000	10,000	2	ヶ月	5,000	10,000	石川リース工業	4月1日	91001
仮設水道料		2	ヶ月	5,000	10,000	2	ヶ月	5,000	10,000	石川リース工業	4月1日	91001

過去の**発注単価**（機器・資材など）
の検索も可能！！

実行予算に対して低い単価で発注する事が多い。
これにより余裕を持った予算管理が行える。
少なくとも予算を超えないように発注する。

No.	業者	工事	注文番号	発注日	税抜金額	消費税	発注内容	仕入		発注残高	
								税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
1	216	02001001-00 川端設備 県道15号線道路改良工事	26000021-00	15/01/07	5,220	417	人力打設	0	0	5,220	417
2		《工事計》			5,220	417		0	0	5,220	417
3	215	S2003002-00 清見建設(株) 第3工区川瀬町粗地区下水道工	25000048-00	15/04/10	528,000	42,240	給排水配管工事	0	0	528,000	42,240
4	215	S2003002-00 清見建設(株) 第3工区川瀬町粗地区下水道工	26000024-00	15/05/11	1,675,000	36,000		1,325,000	106,000	350,000	-70,000
5		《工事計》			2,203,000	78,240		1,325,000	106,000	878,000	-27,760
6		《総合計》			2,208,220	78,657		1,325,000	106,000	883,220	-27,343

出来高払いの際、**発注残管理（未払）**が可能です。
過払い防止や、完成工事で未払確認に活用できます。

注文書									
下記の通りご発注いたしますので、よろしくお願い申し上げます。									
発注先	金沢内装	御中	発注番号	12100	支払条件	末日翌月末	工期	着工	2013/4/20
ご発注額	816,200 円		発注日	2013/4/15	支払内訳	振込		完成	2013/6/5
品名	規格	契約				特記事項			
		数量	単位	単価	金額				
内装工事									

注文書は、**注文書・注文書（控）・注文請書** の
3枚1組が一般的
また、注文書の発行が建設業法で義務化
※1万円以上は印紙も必要
→ OPにより、自動メール送信も可能。

原価日報

Page. 1
2018/11/11

どっと建設株式会社

承認	確認	作成

日付	18/11/11	(日)	天気		気温	最高:	最低:	作成者	101	鈴木 慎一郎
工事	20010002-00	本巣市土木工事						発注者	102	長野土木総合事務所
契約	18/11/20	～			19/03/30	実施				

【原価内訳】

品名	要素内訳	仕入先/業者	数量	単価	金額
生コンクリート(普通)	材料費	吉田生コンクリート(株)	10.00	m3	11,000.0
《要素内訳計》					110,000
《合計》					110,000

材料費配賦

労務費配賦

【労務内訳】

社員	開始時刻	終了時刻	作業時刻	就業内(h)	普通残業(h)	深夜残業(h)	早出残業(h)	手当1(h)	手当2(回)	手当3(日)
林 健二	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杉山 雅博	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
柴田 久雄	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《合計》				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

機械費配賦

【機械内訳】

機械	自社 (h)		自社 (日)		未利用 (日)		未利用 (日)	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
バックホウ0.85m3 (7215)	8.00	26,720	0.00	0	0.00	0	0.00	0
《合計》		8.00	26,720	0.00	0	0.00	0	0.00

【摘要】

日報入力を行うことで、リアルタイムな原価管理が可能。 <主に土木業>

日報管理

Page: 1
2018/11/11

工事 : F9999994-99

出勤日数、残業時間を 給与システムへCSV連動も 可能

[illegible]

藤建設工業 株式会社 御中

工事コード	
工事名称	

請求金額 (税抜)	
消費税 8%	
合計 (税込)	

※契約工事のみ記入

注文番号	
契約金額 (税抜)	
既請求金額 (税抜)	
今回請求金額 (税抜)	
残金 (税抜)	

※担当者査定欄

支払査定金額 (税抜)																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

請 求 書

令和 年 月 日

(住所)

(会社名・代表者名)

【振込先】

(フリガナ)

口座名義

内

日付 19/07/31 伝票番号 30000000 注文番号 280000026-00

業者 112 ミワ管工

工事 20010001-00 装井工場設備工事

倉庫 税額表示 (ない)

TEL 03-0550-2185 FAX 03-0550-2185 業者区分 31日 消費税込 消費税別 03-0550-2185 材料関係 伝票単位 切り捨て

支払予定日 19/08/31 税抜金額 210,000 消費税 16,800 税込金額 226,800 立替金額(税込) 0

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要領内訳	費目
									工種	種別
1	0	通常	0000-0001-000001 舗装切断工	外税	1.00	式	210,000.0	210,000	外注費	9999 外注費

<指定請求書>

- 注文NOを入力するだけで、請求書（発注引用）入力が完了します。

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

仕入検索 仕入複写 予算参照 発注参照 出来高参照 立替参照 ハッター情報変更 列固定

編集 通常

日付 18/11/11 伝票番号 30000789

業者 111 吉田生コンクリート(株)

税額表示 しない

TEL 06-4303-8406 FAX 業者区分 材料関係 締日 31日 消費税計算 明細単位 消費税端数 切り捨て

摘要

支払予定日 18/12/31 ☐ 支払予定日を変更する

税抜金額 220,000

消費税額 17,600 ☐ 伝票計の税額を変更する

税込金額 237,600

立替金額(税込) 0


仕入 立替

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳	工事 注文番号
1	0 通常	☐	生コンクリート(普通) 生コン(普通)16-8-25(20)	1 外税	10.00	m3	11,000.0	110,000	材料費 10000	20010002-00 本巣市土木工事
2	0 通常	☐	生コンクリート(普通) 生コン(普通)16-8-25(20)	1 外税	10.00	m3	11,000.0	110,000	材料費 10000	20060001-00 栗田 吾郎 造成工事
*	0 通常	☐								

工事台帳
仕入元帳
支払予定表

仕入請求書入力することで、
工事台帳・仕入元帳・支払予定表
工事原価一覧表が自動作成されます。

導入前は8作業（一般的な業務の流れ）～11作業（支払通知書及び手形小切手発行を行う場合）
導入後は請求書・支払査定入力のみ。生産性が大幅に向上します。

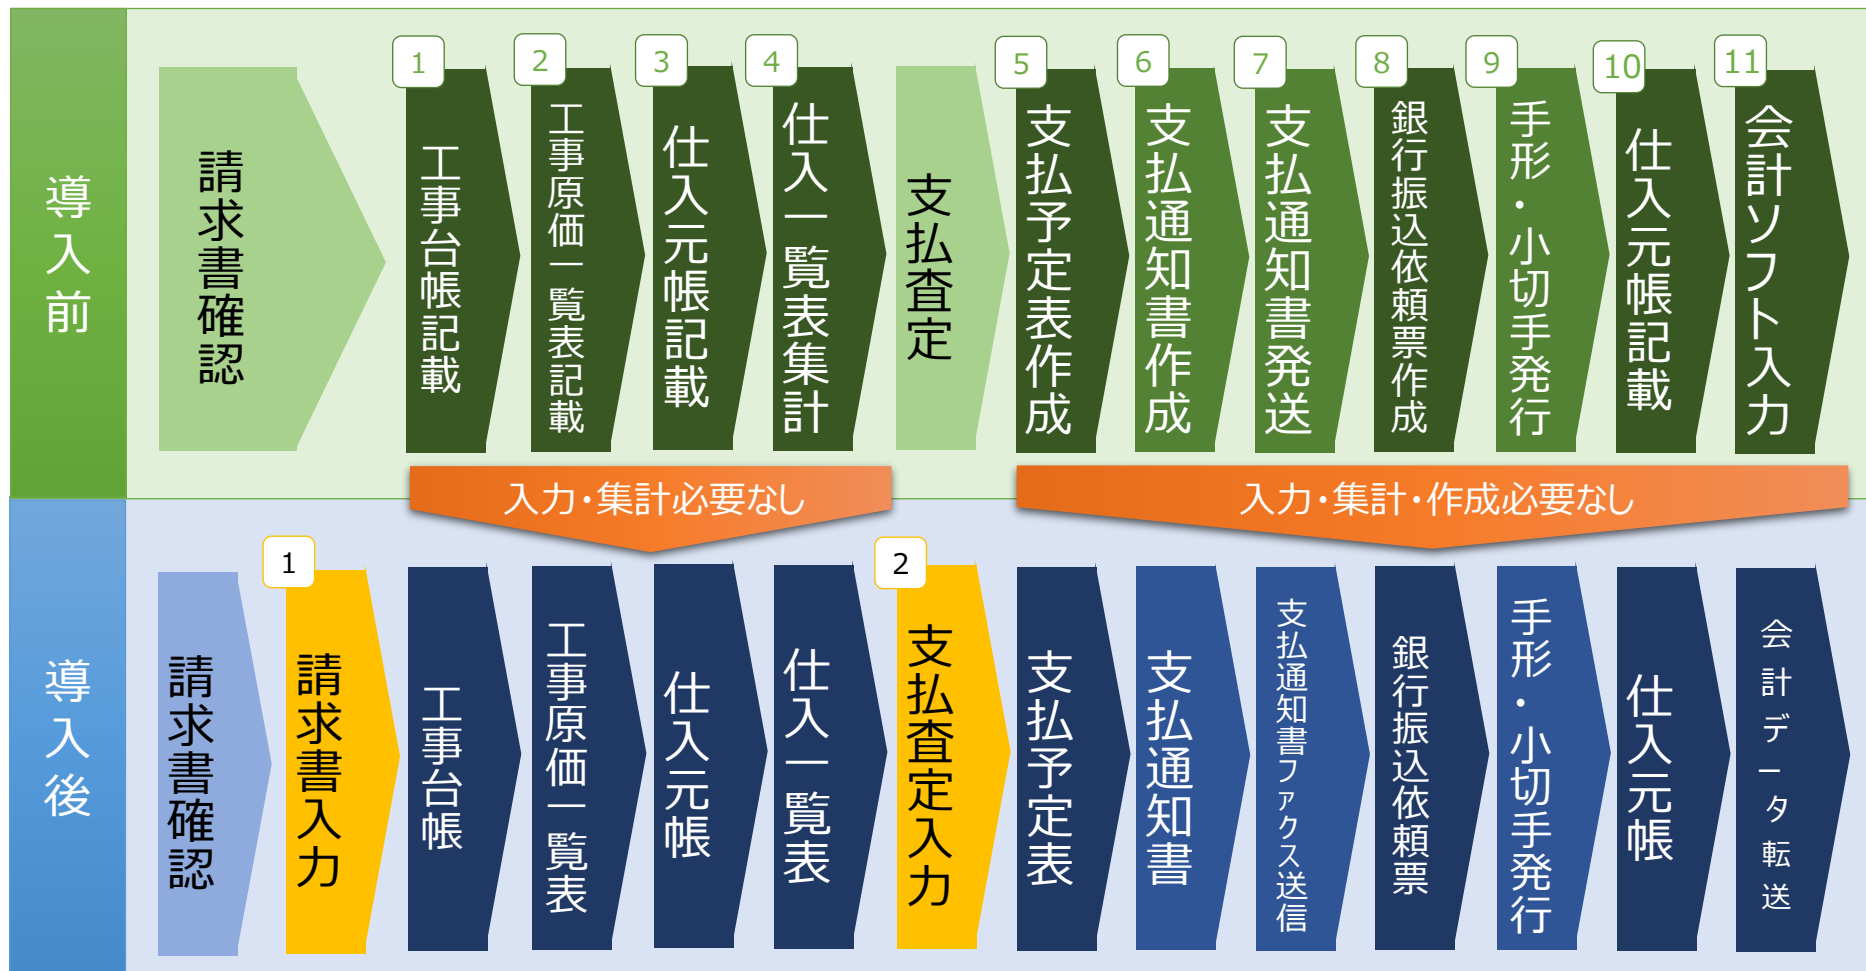

支払一覧表

業者名	4月発生	現金	手形	振込	振込手数料	支払日
吉田生コンクリート	5,442,500		2,721,250	2,720,620	630	5月31日
金沢内装	110,000			109,790	210	5月31日
石川リース工業	30,000			29,790	210	5月31日
合計	5,582,500	0	2,721,250	2,860,200	1,050	

<支払条件>

業者名	締切日／支払日	支払内訳
吉田生コンクリート	月末／翌月末支払	支払額が、100万円以上の場合は、手形50% 振込50%
金沢内装		支払額が、300万円以上の場合は、手形70% 振込30%
石川リース工業		支払額が、300万円以上の場合は、手形70% 振込30%

建設業界では、安全協力会費の控除や
立替金の相殺、支払手形率など支払処理が複雑です。

支払管理

Page. 1
XXXX/03/24

振込銀行： みずほ銀行本店

振込先銀行 振込先支店		預金種目 口座番号	業者 口座名義人	振込金額	手数料 (先方負担)	支払合計	手数料 (当方負担)
0005 三菱東京UFJ銀行 045 六本木支店	123	114 松開発産業 (株) マツカハバウケンギョウ(カ)		1,999,135	864	2,000,000	
0009 三井住友銀行 347 大和支店	1111111	117 コーン建材 (株)					
0001 みずほ銀行 015 築地支店	12345	211 中川組 (株) ナカガワグミ(カ)					
0001 みずほ銀行 005 丸之内支店	555888	214 (株) ナカムラ カナカムラ					
0009 三井住友銀行 211 東京営業部	333333	217 両山電工 (株) ニシヤマデンコウ(カ)					
0534 富山第一銀行 062 泉支店	666666	223 (株) 池太組 カイタウ					
0001 みずほ銀行 402 富山支店	0	240 (株) 東光 カトクウ					
0001 みずほ銀行 440 大阪支店	0	241 (株) 高橋木工所 シタカハシキヤウシヨ					

※手形小切手発行オプション
LITは未対応です

※手形小切手発行オプション
LTは非対応です。

〈お願い〉

みずほ銀行本店 殿

ご依頼 人名	フリガナト ^{フリガナ} フリガナ	お届け印
	どっと建設 株式会社 様 ご連絡先電話番号 076-291-9191	

1. 太線のなかた 2. 総合振込を値 込は、用紙を 3. 振込先銀行は (「n」「同上」) 4. 「預金種目」 受取人のフリ	取組 指定日
---	-----------

送付番号	振込先		預金種目	口座番号	フリガナ お受取人	金額 円	電信指定	手数料	照査印 発行印
	銀行	支店							
1	三菱東京UFJ銀行	六本木支店	普通	0000123	マツカイバウシキョウヨリ(カ)	1,999,136	○	864	
2	三井住友銀行	大和支店	当座	1111111		2,478,136	○	864	
3	みずほ銀行	築地支店	普通	0012345	ナカカワタミ(カ)	1,076,800	○	0	
4	みずほ銀行	丸之内支店	普通	555888	カ)ナカミナ	298,476	○	324	

銀行振込依頼表・FBデータ・支払手形発行などが可能。
でんさいネットとの連携も可能。

顧客 20020003 栗田 吾郎

基本情報 家族情報 フォルダリンク 引合情報 定期点検 業者履歴 工事履歴

名称 栗田 吾郎
略称 栗田 吾郎
敬称 様
フリガナ 栗田 吾郎
郵便番号 921-8001
住所 静岡市高島3-5-77
TEL 078-291-7777
FAX 078-291-8888
携帯
Email
性別 男
生年月日 1976/10/10 42 歳
顧客区分 1 見込み顧客
DM印刷区分 1 する

予算 20,000,000
自己資金 5,000,000

住居種別区分 2 マンション
土地所有区分 2 非所有
顧客条件3
顧客条件4
顧客条件5

補助項目1 長期見込み
補助項目2
補助項目3
補助項目4
補助項目5

備考

発注者 107 栗田 吾郎

工事 点検区分 予定日 工事 実施日 実施担当者 備考

No	点検区分	予定日	工事	実施日	実施担当者	備考
1	6ヶ月点検	14/10/31		14/10/31	101 鈴木 慎一郎	
2	1年点検	15/04/30			108 加藤 健一	
3	2年点検	16/04/30			108 加藤 健一	
4	5年点検	19/04/30			108 加藤 健一	
5	10年点検	24/04/30				

工事 点検区分 予定日 工事 実施日 実施担当者 備考

No	工事	工種	種別	業者	TEL
1	K2002003-00 栗田邸新築工事	201 仮設工事	20212 仮設費	224 (有) アイコーボレーション	045-064-9458
2	K2002003-00 栗田邸新築工事	201 仮設工事	20304 足場及び組立	223 (株) 池太組	079-371-4336
3	K2002003-00 栗田邸新築工事	201 仮設工事	20310 清掃費	224 (有) アイコーボレーション	045-064-9458
4	K2002003-00 栗田邸新築工事	209 土工		240 (株) 東光	0771-95-0198
5	K2002003-00 栗田邸新築工事	218 タイル工事		225 (株) 大野タイル	0268-53-7192
6	K2002003-00 栗田邸新築工事	220 木工		117 コーン建材 (株)	0965-63-8527
7	K2002003-00 栗田邸新築工事	220 木工		251 (株) 米山板金工業所	076-962-9108
8	K2002003-00 栗田邸新築工事	221 屋根工事		232 小松工務店 (株)	0779-15-8252
9	K2002003-00 栗田邸新築工事	224 左官工事		239 (有) サワ左官	0983-82-1579
10	K2002003-00 栗田邸新築工事	225 鋼製建具工事		218 アルミ建材工業	022-942-3972
11	K2002003-00 栗田邸新築工事	227 木製建具工事		241 (株) 高橋木工所	099-883-0602
12	K2002003-00 栗田邸新築工事	232 内装工事		245 (株) 黒一内装	053-852-7299
13	K2002003-00 栗田邸新築工事	236 雑工事	23606 衛生家具工事	240 (株) 東光	0771-95-0198
14	K2002003-00 栗田邸新築工事	239 設備工事	23909 電気設備工事	210 (株) 光電気	0834-73-8309
15	K2002003-00 栗田邸新築工事	5001 金属工事		251 (株) 米山板金工業所	076-962-9108

顧客の管理が可能です。

工事履歴・業者履歴・点検予定日の管理ができます。

顧客
20020003
栗田 吾郎

受付日
-/-/
~
-/-/

工事
-
~
-

フガナ
始まる

アフター

No.	受付日	工事	アフター-受付区分	アフター-受付詳細	アフター-処理区分	アフター-処理内容	予定日	実施日	実施業者	支払金額
1	15/04/22	K2002003-00 栗田邸新築工事	3	屋根破損、ズレ 屋根から水漏れが出ている。	1	当社アフター 屋根ズレ修復	15/04/28	211	中川組 (株)	
2	15/05/12	K2002003-00 栗田邸新築工事	9	その他 クロスが剥がれている	1	当社アフター 内壁補修	15/05/15	211	中川組 (株)	
*										

顧客の訪問・問い合わせ履歴の管理が可能です。

無償・有償アフターの集計、どんな症状でのクレームが多いなどの集計分析として活動できます。

どっと原価NEO ＋ 会計システム

- ・仕入・売上・支払・入金 全ての伝票から
- ・仕訳伝票を自動作成し二度手間を省くことで
- ・生産性向上が図れます。

会計システムより勘定科目を取り込み

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) 検索(H) 表示(V) 印刷(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カートリ 列幅解除 閉じる ガイド 出力

編集

No.	科目コード	科目名	科目フリガナ	税区分	貸借区分	貸借・損益区分	部門管理区分
116	3611-0000	新株予約権					
117	4111-0000	完成工事高					
118	4112-0000	売上高					
119	4113-0000	売上高					
120	4114-0000	売上高					
121	4115-0000	売上値引戻り高					
122	5111-0000	期首たな卸高					
123	5211-0000	商品仕入高					
124	5213-0000	仕入値引戻し高					
125	5273-0000	他勘定振替高					
126	5311-0000	期末たな卸高					
127	5411-0000	期首材料たな卸高					
128	5412-0000	材料仕入高					
129	5413-0000	期末材料たな卸高					
130	5414-0000	副資材仕入高					
131	5431-0000	賞金					
132	5432-0000	賞与					
133	5433-0000	雑給					
134	5434-0000	法定福利費					
135	5435-0000	厚生費					
136	5436-0000	社内外注費					
137	5437-0000	研修費					
138	5438-0000	退職金					
139	5441-0000	外注加工費					
140	5451-0000	電力費					
141	5452-0000	ガス代					
142	5453-0000	水道料					
143	5454-0000	運賃					
144	5455-0000	減価償却費					
145	5456-0000	修繕費					
146	5457-0000	租税公課					

科目名を入力します。(半角 40 桁)

仕訳パターンの設定

要素 原価要素内訳 支払内訳 売上内訳 入金内訳												
要素 4 現場経費												
No.	コード	要素内訳名	借方 科目	貸方 科目	予備 区分	消費税 科目	貸借区分	完成 科目				
1	0	現場経費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0000 完成工事原価				
2	41	仮設経費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0041 完成工事原価	仮設経費			
3	42	運搬費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0042 完成工事原価	運搬費			
4	43	機械等経費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0043 完成工事原価	機械等経費			
5	44	設計費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0044 完成工事原価	設計費			
6	45	労務管理費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0045 完成工事原価	労務管理費			
7	52	従業員給料手当 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	0	仮払消費税等	1 借方	5111-0052 完成工事原価	従業員給料手当			
8	55	退職共済金 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	0	仮払消費税等	1 借方	5111-0055 完成工事原価	退職金			
9	57	法定福利費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0057 完成工事原価	法定福利費			
10	58	福利厚生費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0058 完成工事原価	福利厚生費			
11	67	事務用品費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0067 完成工事原価	事務用品費			
12	68	通信費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0068 完成工事原価	通信費			
13	69	旅費交通費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0069 完成工事原価	旅費交通費			
14	70	動力用水光熱費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0070 完成工事原価	動力用水光熱費			
15	74	交際費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0074 完成工事原価	交際費			
16	76	地代家賃 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0076 完成工事原価	地代家賃			
17	77	補償費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0077 完成工事原価	補償費			
18	78	補償費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0078 完成工事原価	補償費			
19	80	租税公課 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	0		1 借方	5111-0080 完成工事原価	租税公課			
20	81	保険料 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0081 完成工事原価	保険料			
21	82	会費及負担金 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0082 完成工事原価	会費及び負担金			
22	89	雑費 (請求書)	1157-0000 未成工事支出金	2133-0000 工事未払金	5	仮払消費税等	1 借方	5111-0089 完成工事原価	雑費			

どっと原価で入力する仕訳を洗い出してもらい、すべてのパターンを登録可能
参照画面：現場経費

入力例 1. 仕入原価

日付	16/06/30	伝票番号	473990	注文番号		摘要	
業者	129	柳沢電設工業 株式会社				支払予定日	16/07/31
工事	56302	1 6 郵政雑工事				税抜金額	87,000
税額表示	しない					消費税	6,960
TEL	FAX	業者区分	締日	消費税計算	消費税端数	税込金額	93,960
0267-62-0616		大口取引先	31日	伝票単位	切り捨て	立替金額(税込)	0

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳	費目 工種 種別
1	0 通常	☐	工事代 0000-0030-000487	1 外税	1.00	式	87,000.0	87,000	外注費 30000 (請求書)	9 31 省略 電気設備工事費
*	0 通常	☐								

借) 未成工事支出金 貸) 工事未払金

入力例 2. 支払

日付	16/07/31	伝票番号	156	摘要	
業者	129	柳沢電設工業 株式会社		工事入力方法	☐ 工事別に金額を入力する
TEL	FAX	業者区分	支払月	銀行情報表示	☒ 銀行情報を表示する
0267-62-0616		大口取引先	1ヶ月後	支払金額	126,360
			支払日		
			31日		

No.	取引区分	伝票区分	金額	支払要素内訳	備考1 備考2	手形期日 手形番号	会社口座	銀行支店	銀行 支店	預金種目	口座番号 口座名義人(カナ)
1	0 通常	22 振込	125,820	2112 工事未払金			1 会社口座 1 (八十	0143-383 八十二銀行 野沢支店		1 普通	0089565 やけいカデンシコウ
2	0 通常	23 手数料	540	2112 工事未払金							
*	0 通常										

借) 工事未払金 貸) 当座預金 (八十二銀行)
支払手数料

入力例 3. 売上⇒請求書発行

伝票日付	16/06/16	伝票番号	7	請求日付	16/06/16	摘要	
請求先	33	株式会社コトブキ		請求番号			
工事	55301 - 20	1 5 建築雑工事	☒	請求締日			
税額表示	しない			税抜金額	27,222		
TEL	FAX	回収担当者	締日	消費税	2,178	☐ 伝票計の税額を変更する	
			消費税込	税込金額	29,400		

No.	取引区分	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	売上要素内訳 客先注文番号
1	0 通常	取下金	外税	1.00	式	27,222.0	27,222	1001 取下金
0								



請求書		Page: 1
〒115-8551 東京都豊島区高島5-1-3 4 東京建設ビル3F 4階	TEL 03-5541-1147 FAX 03-5541-1148	小千代建設株式会社 (代表) 1158551
請求書 株式会社	請求 0	小千代建設株式会社 (代表) 1158551
品名/規格	数量	単位
0010-0001-000989	1.00	式
27,222.0		
27,222		
2,178		
29,400		

入力例 4. 入金

日付	16/06/16	伝票番号	3	摘要	
請求先	33	株式会社コトブキ		請求番号	
TEL	FAX	回収担当者	回収月	回収日	
			1ヶ月後	31日	

入金額	29,400
-----	--------

No.	取引区分	伝票区分	入金要素内訳	備考1 備考2	手形期日 手形番号	工事
1	0 通常	振込	振込 (八十二) 完成工事			55301-20 1 5 建築雑工事
*	0 通常		借) 当座預金 (八十二銀行) 貸) 未成工事受入金			

業務改善例

会計連動

入力例 5. 完成工事一括登録

どっと原価 NEO EX どっと建設株式会社 - [完成工事一括登録]

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(D) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S)
最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カソール 列幅解除
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 SPICE Ctrl-P

表示順 ☒ 工事順 ☐ 完成日順 ☒ 昇順 ☐ 降順
未成・完成 ☒ 未成 ☐ 完成 ☐ 両方
完成区分 ☐ 部分完成 ☐ 全部完成 ☒ 両方
工事 ~
受注日(工事) ~
受注日(請負) ~

編集

完成日 18/11/04
一括指定

全選択 全解除

No.	選択	完成日	工事	発注者	部門	営業担当者	現場代理人	受注日	契約工期	実施工期	税抜金額	消費税
1	☐		0010001-00 トヨタ記念病院太陽光設備機器	101 東川建設 (株)	99 本社	林 健二		18/10/23			5,346,000	427,680
2	☐		0010002-00 岐阜県リフォーム工事	101 東川建設 (株)	99 本社	林 健二	鈴木 慎一郎	18/10/23	18/11/01	19/03/30	10,000,000	800,000
3	☐		0010003-00 浜松市土木工事	101 東川建設 (株)		林 健二	鈴木 慎一郎	18/10/24	18/11/10	19/03/30	5,000,000	400,000
4	☐		0010004-00 栗田邸新築工事	107 栗田 吾郎	99 本社	林 健二	杉山 雅博	18/10/25	18/11/01	19/04/30	50,000,000	4,000,000
5	☐		0010005-00 愛知工場太陽光工事	101 東川建設 (株)	99 本社	林 健二	鈴木 慎一郎	18/10/26	18/11/10	19/03/30	2,072,000	165,760
6	☐		0010008-00 稲沢邸新築工事	107 栗田 吾郎	99 本社	林 健二	鈴木 慎一郎	18/10/30	18/11/10	19/05/31	50,000,000	4,000,000
7	☒		0010009-00 静岡市土木工事	101 東川建設 (株)		鈴木 慎一郎	林 健二	18/11/01	18/11/10	19/04/30	20,000,000	1,600,000
8	☐		0060001-00 栗田 吾郎 造成工事	107 栗田 吾郎	7 住宅	杉山 雅博		14/07/01			1,000,000	80,000
9	☐		2002002-00 池田町多目的ホール工事	104 北秋田市土木事務所	2 建築部	加藤 健一	林 健二	14/10/14	14/10/22	15/10/30	60,000,000	4,800,000
10	☐		2002002-00 池田町多目的ホール工事	104 北秋田市土木事務所	2 建築部	加藤 健一	林 健二	14/12/01	14/12/18	15/10/30	40,000,000	3,200,000
11	☐		2002006-00 前川邸新築工事	101 東川建設 (株)	2 建築部	山口 明夫		14/10/07	14/10/21	15/01/31	24,000,000	1,920,000
12	☐		2003002-00 第3工区川瀬町粗地区下水道工事	104 北秋田市土木事務所	3 設備部	鈴木 慎一郎	林 健二	15/03/10	15/03/10	15/09/30	12,500,000	1,000,000
13	☐		2003003-02 横浜市中区天池町維持修繕工事 (追加変更)	105 (株) 横浜土木	3 設備部	杉山 雅博	柴田 久雄	14/10/01	14/10/01	14/10/20	400,000	32,000
14	☐		2004001-00 優秀大教育学部改修仮設電気工事	103 佐賀市役所土木課	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/15	14/10/22	14/10/30	7,000,000	560,000
15	☐		2004001-00 優秀大教育学部改修仮設電気工事	103 佐賀市役所土木課	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/20	14/11/02	15/01/31	1,000,000	80,000
16	☐		2004002-00 第一小学校2~3F電灯改修工事	113 (株) 吉田組開発	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/22	14/10/25	14/11/07	750,000	60,000
17	☐		2004003-00 県医師会共同ビル新築工事	112 ミワ開発 (株)	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/01	14/10/01	14/12/31	16,500,000	1,320,000
18	☐		2004005-00 HGBビルテナント改装に伴う照明	1078 (株) ハウス住建	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/17			4,000,000	320,000
19	☐		2004006-00 山田邸電気工事	112 ミワ開発 (株)	4 電気部	柴田 久雄	岩田 敦	14/10/01	14/10/01	15/02/28	1,000,000	80,000
20	☐		2008003-00 松阪総合7Fビル維持管理	106 松阪開発公団	2 建築部			14/10/01	14/10/01	15/09/30	1,200,000	96,000
21	☐		0016003-00 県医師会共同ビル新築工事 (電気追加工事)	112 ミワ開発 (株)	4 電気部	小川 慎一郎	岩田 敦	14/10/01	14/10/01	14/11/30	943,235	75,459
22	☐		0050309-00 金沢産業 給排水衛生設備工事	113 (株) 吉田組開発	3 設備部			14/10/01	14/10/14		1,447,710	115,817
23	☐		0085001-00 佐伯町庁舎新築工事	114 佐伯町役場	99 本社	鈴木 慎一郎		14/09/25	14/10/01	15/09/30	26,694,000	2,135,520
24	☐		0088000-00 佐賀市役所改築工事 (全体分)	103 佐賀市役所土木課	99 本社	鈴木 慎一郎	杉山 雅博	14/10/01	14/10/01	15/09/30	25,000,000	2,000,000
25	☐		0088000-01 佐賀市役所改築工事 (自社分)	103 佐賀市役所土木課	99 本社	鈴木 慎一郎		14/10/01	14/10/01	15/09/30	17,500,000	1,400,000

借) 完成工事原価 貸) 未成工事支出金
借) 完成工事未収入金 貸) 完成工事高
借) 未成工事受入金 貸) 完成工事未収入金

どっと原価NEO 製品概要

使いやすさと柔軟性で業務の合理化と経営の効率化を両立し、
企業の管理レベル向上を可能にする原価管理システムです。

内部
統制



業務
効率化



情報の
一元化

受注管理

予算計画

原価管理

支払・請求

財務連動

見積/受注(フロント→ミドル業務)から
買掛・売掛の財務連動(ミドル→バックオフィス業務)まで
全社業務の流れをトータルにサポート

どっと原価NEO 製品概要

基幹業務（ミドル・バックオフィス業務）




内部統制

承認機能

ワークフロー連携

管理機能

どっと原価NEO 製品コンセプト

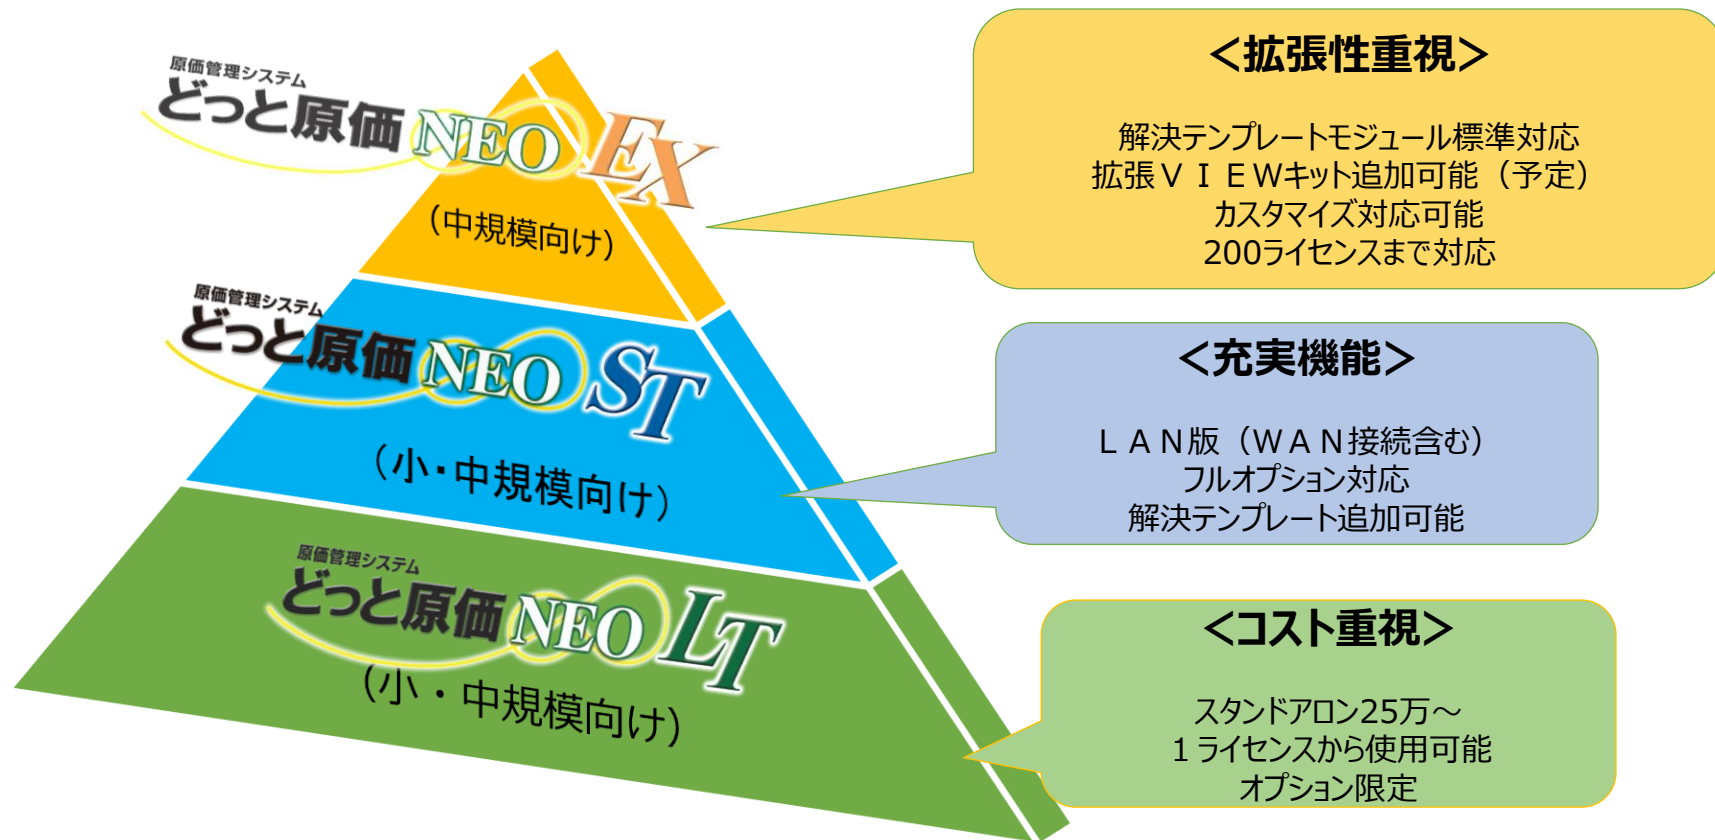

3つのタイプで経営をしっかりサポート

どっと原価NEO 製品特徴

オプション選択式

- 利用目的に応じて、自社に必要な機能だけを絞って導入が可能です。
- よりリーズナブルに、機能を限定した部分導入、段階導入が可能となります。

同時アクセスライセンス

- インストール台数は無制限です。
- 同時に使用する台数分なので導入費用を抑えることができます。

EXCELフリー帳票

- 帳票の原本がExcelなので、レイアウト加工が可能（全帳票対応）
- ご使用のExcel帳票も「どっと原価NEO」の印刷書式として利用可能です。

外部システム連携

- システムに入力された各種データを、自動的に仕訳データに変換・出力し、市販の財務会計システムへ、FBデータをオンラインバンキングへ等、外部システムとデータ連携を行うことができます。

オプション選択式

オプション選択式により利用目的や業種に合わせたシステムチョイスが可能です。
機能ごとの購入・利用に対応しておりますので、実現したい機能の範囲にあわせた部分導入が可能です。また、将来の会社の成長や、管理レベルの発展を見据えて、フェーズをわけた段階導入にも対応が可能です。




同時アクセスライセンス

ライセンス数にかかわらずインストールは何台でも可能です。
“同時に起動する台数”分のクライアントライセンスが必要になります。

※スタンドアロン版の場合は不要

クライアントライセンスが3の場合

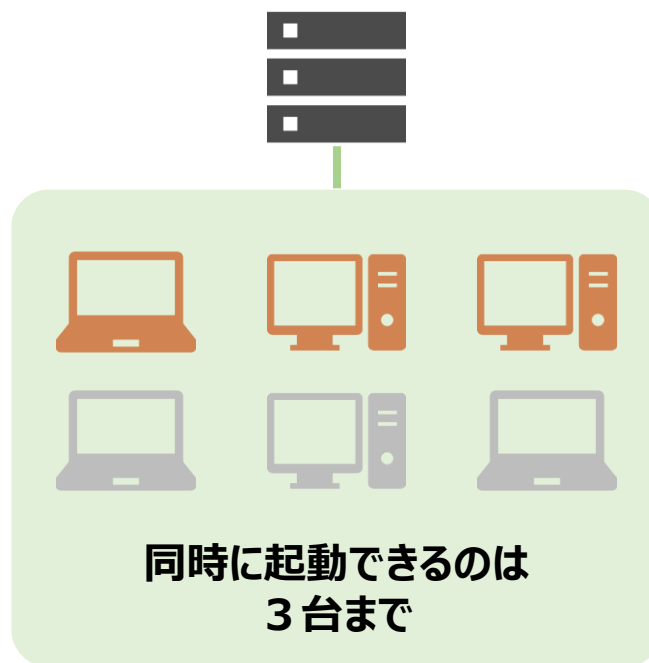

導入費用例 どっと原価NEO LTの場合

業 種	導入 オプション例	LT スタンドアロン版	LT ネットワーク版 (3ライセンス)	ユースウェア費用
		()内は年間保守料金		
元請 建築工事業 土木工事業	見積作成 発注管理 支払管理	¥550,000	¥900,000	【インストール費用】 ¥40,000～ 【操作指導費用】 ¥150,000～
		(¥66,000)	(¥113,000)	
下請 土木工事業	日報管理	¥350,000	¥600,000	
		(¥44,000)	(¥80,000)	
専門工事業	見積作成 日報管理	¥450,000	¥750,000	
		(¥55,000)	(¥96,500)	
総合建設業	Bセット	¥750,000	¥1,200,000	
		(¥82,500)	(¥135,000)	



—ゆとりある企業づくりをサポートする—

株式会社 **建設ドットウェブ**
